

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -1	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/0067 Pavlov		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
IČO: 47534630

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-50 433,60	39 464,00	-10 969,60

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-50 433,60	39 464,00	-10 969,60

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -1	Číslo ZBV / Skupina změny: 2/3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/0067 Pavlov		

Strany smlouvy o dílo SMLD-0427/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 27.3.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o., se sídlem Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

<u>Přílohy Změnového listu</u>	<u>Příjemce</u>
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 2 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 29 počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Změny dle zaměření skutečného provedení

III/0067 Pavlov

Dle PDPS spočívá obnova obrusné vrstvy v odfrézování živичného krytu do tl. 50 mm v celé ploše (s následným odkupem recyklátu), provedení spoj. postřiku PS-CP 0,5 kg/m², pokládky asfalt.betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm s plynulým napojením na navazující úsek, čištění krajnic od nánosu a zpevnění krajnic z recyklátu.

Po zaměření skutečného provedení stavby geodetem (viz doklad č. 11) došlo k upravení množství SoD dle skutečnosti.

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-50 433,60	39 464,00	-10 969,60	89 897,60

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Kamil Hrbek podpis

Projektant (autorský dozor): jméno xxx podpis

Stavební dozor: jméno Petr Burger podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Karel Motal podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno xxx podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13. Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno xxx podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Kamil Hrbek podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	III/0067 Pavlov

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
663 456,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
III/0067 Pavlov	0,00	0,00	663 456,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
III/0067 Pavlov	-50 433,60	39 464,00	39 464,00	5,95%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
III/0067 Pavlov	-50 433,60	652 486,40	-10 969,60	-1,65%

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek

Číslo a název SO/PS: III/0067 Pavlov

Číslo a název rozpočtu: staničení silnice v km 2,020 - 2,370

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO -

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	113728	frézování asfalt.ploch, odvoz do 20 km	m3	96,500	85,100	-11,400	504,000	48 636,00	-5 745,60	0,00	42 890,40	-5 745,60	-11,81%
3	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50 mm	bm	20,000	49,000	29,000	44,000	880,00	0,00	1 276,00	2 156,00	1 276,00	145,00%
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	1930,000	1702,000	-228,000	3,000	5 790,00	-684,00	0,00	5 106,00	-684,00	-11,81%
5	572223	spojovací postřik ze sil.emulze do 1,0 kg/m2	m2	1930,000	1702,000	-228,000	7,000	13 510,00	-1 596,00	0,00	11 914,00	-1 596,00	-11,81%
6	574A44	asfalt.beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm	m2	1930,000	1702,000	-228,000	186,000	358 980,00	-42 408,00	0,00	316 572,00	-42 408,00	-11,81%
7	89921	výšková úprava šachty, vpusti	ks	22,000	28,000	6,000	4000,000	88 000,00	0,00	24 000,00	112 000,00	24 000,00	27,27%
8	89923	výšková úprava krycích hrnců	ks	12,000	18,000	6,000	1920,000	23 040,00	0,00	11 520,00	34 560,00	11 520,00	50,00%
9	113761	frézování drážky průřezu spár š.do 100 mm2	m	20,000	49,000	29,000	44,000	880,00	0,00	1 276,00	2 156,00	1 276,00	145,00%
10	931311	Ztěsnění dilatačních spar asf.zálivkou průřezu do 100 mm2	m	20,000	49,000	29,000	48,000	960,00	0,00	1 392,00	2 352,00	1 392,00	145,00%
Celkem									- 50 433,60	39 464,00		- 10 969,60	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Za Objednatele: Petr Burger

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek**

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	8 574 748,60
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	8 758 480,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	10 597 760,80
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	102,14%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	183 731,40
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,14%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 572 424,58

12=(1)*0,15	Limit	D4*0,15
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek	- 57 280,60	241 012,00	183 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 57 280,60	241 012,00	183 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	1	III/10141 Brandýsek - doměrky dle zaměření	- 6 847,00	201 548,00	194 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 847,00	201 548,00	194 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	III/0067 Pavlov - doměrky dle zaměření	- 50 433,60	39 464,00	- 10 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50 433,60	39 464,00	-10 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby:	III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/0067 Pavlov
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/1

Doklad	počet listů
08 Zaměření skutečného provedení stavby	4
09 Výpočtové listy včetně příloh	18
10 Oznámení zhotovitele	5
11 Vyjádření TDS	1
12 Pokyn objednatele	1
Počet listů celkem	29

7	89921	výšková úprava šachty, vpusti SoD 22 ks ZBV 2 dle zaměření navýšeno množství přičteno +6 ks Celkem 28 ks	ks	22,000	28,000	6,000	4000,000	88 000,00	0,00	24 000,00	112 000,00	24 000,00	27,27%
8	89923	výšková úprava krycích hrnců SoD 12 ks ZBV 2 dle zaměření navýšeno množství připočteno +6 ks Celkem 18 ks	ks	12,000	18,000	6,000	1920,000	23 040,00	0,00	11 520,00	34 560,00	11 520,00	50,00%
9	113761	frézování drážky průřezu spár š.do 100 mm2 SoD 20 m ZBV 2 dle zaměření navýšeno množství připočteno +29 m Celkem 49 m	m	20,000	49,000	29,000	44,000	880,00	0,00	1 276,00	2 156,00	1 276,00	145,00%
10	931311	Ztěsnění dilatačních spar asf.zálivkou průřezu do 100 mm2 SoD 20 m ZBV 2 dle zaměření navýšeno množství připočteno +29 m Celkem 49 m	m	20,000	49,000	29,000	48,000	960,00	0,00	1 392,00	2 352,00	1 392,00	145,00%
11	12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	200,000	200,000	0,000	35,000	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
12	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100 mm	m2	200,000	200,000	0,000	214,000	42 800,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00%
13	015111	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	26,000	26,000	0,000	160,000	4 160,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00%
14	915111	VDZ V4 - 12,5 cm, barvou, základní	m2	88,000	88,000	0,000	120,000	10 560,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00%
15	915211	VDZ - vodící proužky V4 - 12,5, přechod pro chodce atd., plast, retroflexní	m2	88,000	88,000	0,000	270,000	23 760,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00%
Celkem								663 456,00	- 50 433,60	39 464,00	652 486,40	- 10 969,60	-1,65%

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce/zakázky : Oprava živičného povrchu silnic č. III/0067 Pavlov
Zaměření asfaltových ploch
Číslo zakázky : 133 / 2025
Katastrální území : Pavlov u Unhoště
Obec : Pavlov
Kraj : Středočeský
Souřadnicový systém : S-JTSK
Výškový systém : Bpv
Datum provedení měření : 14.5.2025
Zaměřil : Daniel Sigmund
Objednavatel : FRONĚK, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
Dodavatel : MESS GEO GROUP s.r.o., K. H. Borovského 1144/4, 434 01 Most

POLNÍ PRÁCE

Polohové a výškové měření provedeno metodou GNSS.
Příjem datových korekcí byl proveden přes síť Trimble VRS Now.
Transformace do S-JTSK byla provedena v transformačním klíči Křovák 2018.
Měření odpovídá 3. třídě přesnosti.

KANCELÁŘSKÉ PRÁCE

Výpočty byly zpracovány programovým systémem Geus 16.0, grafické výstupy byly zpracovány programovým systémem Bentley Map PowerView V8i (SELECTseries 4), určeným ke zpracování naměřených dat, souřadnicovým výpočtům a grafickým výstupům v zeměměřičské praxi.

Výpočet ploch byl vyhotoven programovým systémem Bentley Map PowerView V8i (SELECTseries 4).

Jako podklad pro tištěnou část byla použita digitální katastrální mapa.



Veškeré polní a kancelářské práce byly provedeny podle norem platných pro zeměměřičské práce ve výstavbě a přesnosti a způsobem provedení těmto předpisům odpovídají. Měřičské zápisníky, náčrty a protokoly o výpočtech jsou uloženy v dokumentaci firmy, která měření provedla.

Zakázka je vyhotovena dle platných norem ČSN 01 3410, ČSN 01 3411, ČSN 73 0415.

SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva.
2. Seznam souřadnic
3. Výkresová dokumentace.

V Mostě 27.05.2025

Vyhotovil



SEZNAM SOUŘADNIC ZAMĚŘENÝCH BODŮ


Oprava živičného povrchu silnic č. III/0067 Houstoň
Zaměření asfaltových ploch

Souřadnicový systém : S-JTSK

Výškový systém : Bpv

Číslo bodu	Y	X	Z
474	757644.99	1037929.91	347.94
475	757645.74	1037929.91	347.94
476	757645.92	1037930.70	347.96
477	757645.55	1037931.23	347.99
478	757640.53	1037931.39	348.03
479	757636.36	1037932.75	348.13
480	757635.59	1037933.61	348.16
481	757634.29	1037934.08	348.24
482	757629.38	1037935.38	348.38
483	757629.26	1037934.69	348.30
484	757632.57	1037927.94	347.79
485	757636.21	1037921.41	347.46
486	757629.08	1037918.57	347.24
487	757628.26	1037917.40	347.15
488	757627.69	1037916.92	347.12
489	757630.55	1037911.48	347.01
490	757635.62	1037913.12	347.15
491	757639.03	1037914.25	347.22
492	757642.25	1037914.75	347.21
493	757644.48	1037914.72	347.22
494	757644.54	1037915.09	347.24
495	757653.65	1037920.09	347.30
496	757655.00	1037920.86	347.34
497	757655.37	1037920.68	347.29
498	757655.33	1037921.57	347.54
499	757655.39	1037921.74	347.52
500	757655.13	1037922.12	347.52
501	757649.59	1037922.23	347.54
502	757644.39	1037922.09	347.58
503	757612.71	1037910.82	346.45
504	757614.62	1037905.51	346.34
505	757604.33	1037901.45	345.83
506	757602.34	1037906.80	345.94
507	757592.98	1037903.19	345.45
508	757587.51	1037900.85	345.14
509	757573.25	1037895.01	344.25
510	757575.59	1037890.34	344.15
511	757593.30	1037897.38	345.28
512	757569.35	1037887.67	343.77
513	757567.48	1037892.65	343.90
514	757553.73	1037887.55	342.95
515	757555.57	1037882.36	342.78
516	757539.43	1037876.19	341.74
517	757539.64	1037882.21	341.96
518	757539.26	1037882.21	341.94
519	757533.70	1037880.08	341.58
520	757532.89	1037879.61	341.52
521	757517.28	1037873.57	340.72
522	757519.23	1037868.36	340.68
523	757505.98	1037863.18	340.12
524	757504.03	1037868.32	340.16
525	757490.14	1037862.89	339.69
526	757490.51	1037857.10	339.59
527	757476.95	1037851.79	339.16
528	757475.32	1037856.87	339.20
529	757466.44	1037853.33	338.88
530	757463.46	1037852.65	338.82
531	757457.37	1037850.31	338.58

532	757456.97	1037850.00	338.51
533	757459.14	1037844.85	338.47
534	757450.51	1037841.46	338.14
535	757448.47	1037846.74	338.11
536	757440.30	1037843.64	337.79
537	757442.05	1037838.34	337.76
538	757423.77	1037831.86	337.16
539	757420.55	1037836.85	337.13
540	757415.37	1037834.84	337.00
541	757412.54	1037833.64	336.91
542	757414.36	1037828.46	336.89
543	757402.61	1037823.99	336.57
544	757401.77	1037829.90	336.69
545	757393.01	1037826.62	336.46
546	757389.44	1037825.16	336.39
547	757385.08	1037823.54	336.30
548	757384.51	1037825.05	336.35
549	757380.90	1037823.93	336.25
550	757381.56	1037822.22	336.21
551	757375.42	1037820.04	336.07
552	757377.49	1037814.89	336.04
553	757389.69	1037819.20	336.28
554	757364.58	1037810.63	335.85
555	757352.65	1037806.77	335.57
556	757342.85	1037804.22	335.35
557	757330.06	1037801.89	335.05
558	757313.79	1037799.77	334.76
559	757300.46	1037798.09	334.54
560	757283.91	1037796.71	334.42
561	757265.81	1037794.87	334.30
562	757250.80	1037793.33	334.31
563	757237.92	1037791.89	334.18
564	757219.78	1037789.67	334.23
565	757219.32	1037795.17	334.26
566	757230.02	1037796.36	334.25
567	757243.71	1037797.61	334.19
568	757256.97	1037799.02	334.23
569	757272.89	1037800.77	334.30
570	757286.95	1037802.06	334.33
571	757303.25	1037803.93	334.60
572	757314.77	1037805.39	334.66
573	757318.18	1037805.86	334.73
574	757319.01	1037806.37	334.76
575	757319.22	1037806.40	334.75
576	757319.30	1037806.02	334.74
577	757331.17	1037807.70	334.90
578	757335.15	1037808.23	334.99
579	757335.08	1037808.58	334.98
580	757335.45	1037808.43	334.97
581	757335.77	1037808.38	335.00
582	757345.58	1037810.53	335.23
583	757356.36	1037813.58	335.60
584	757364.02	1037816.10	335.76

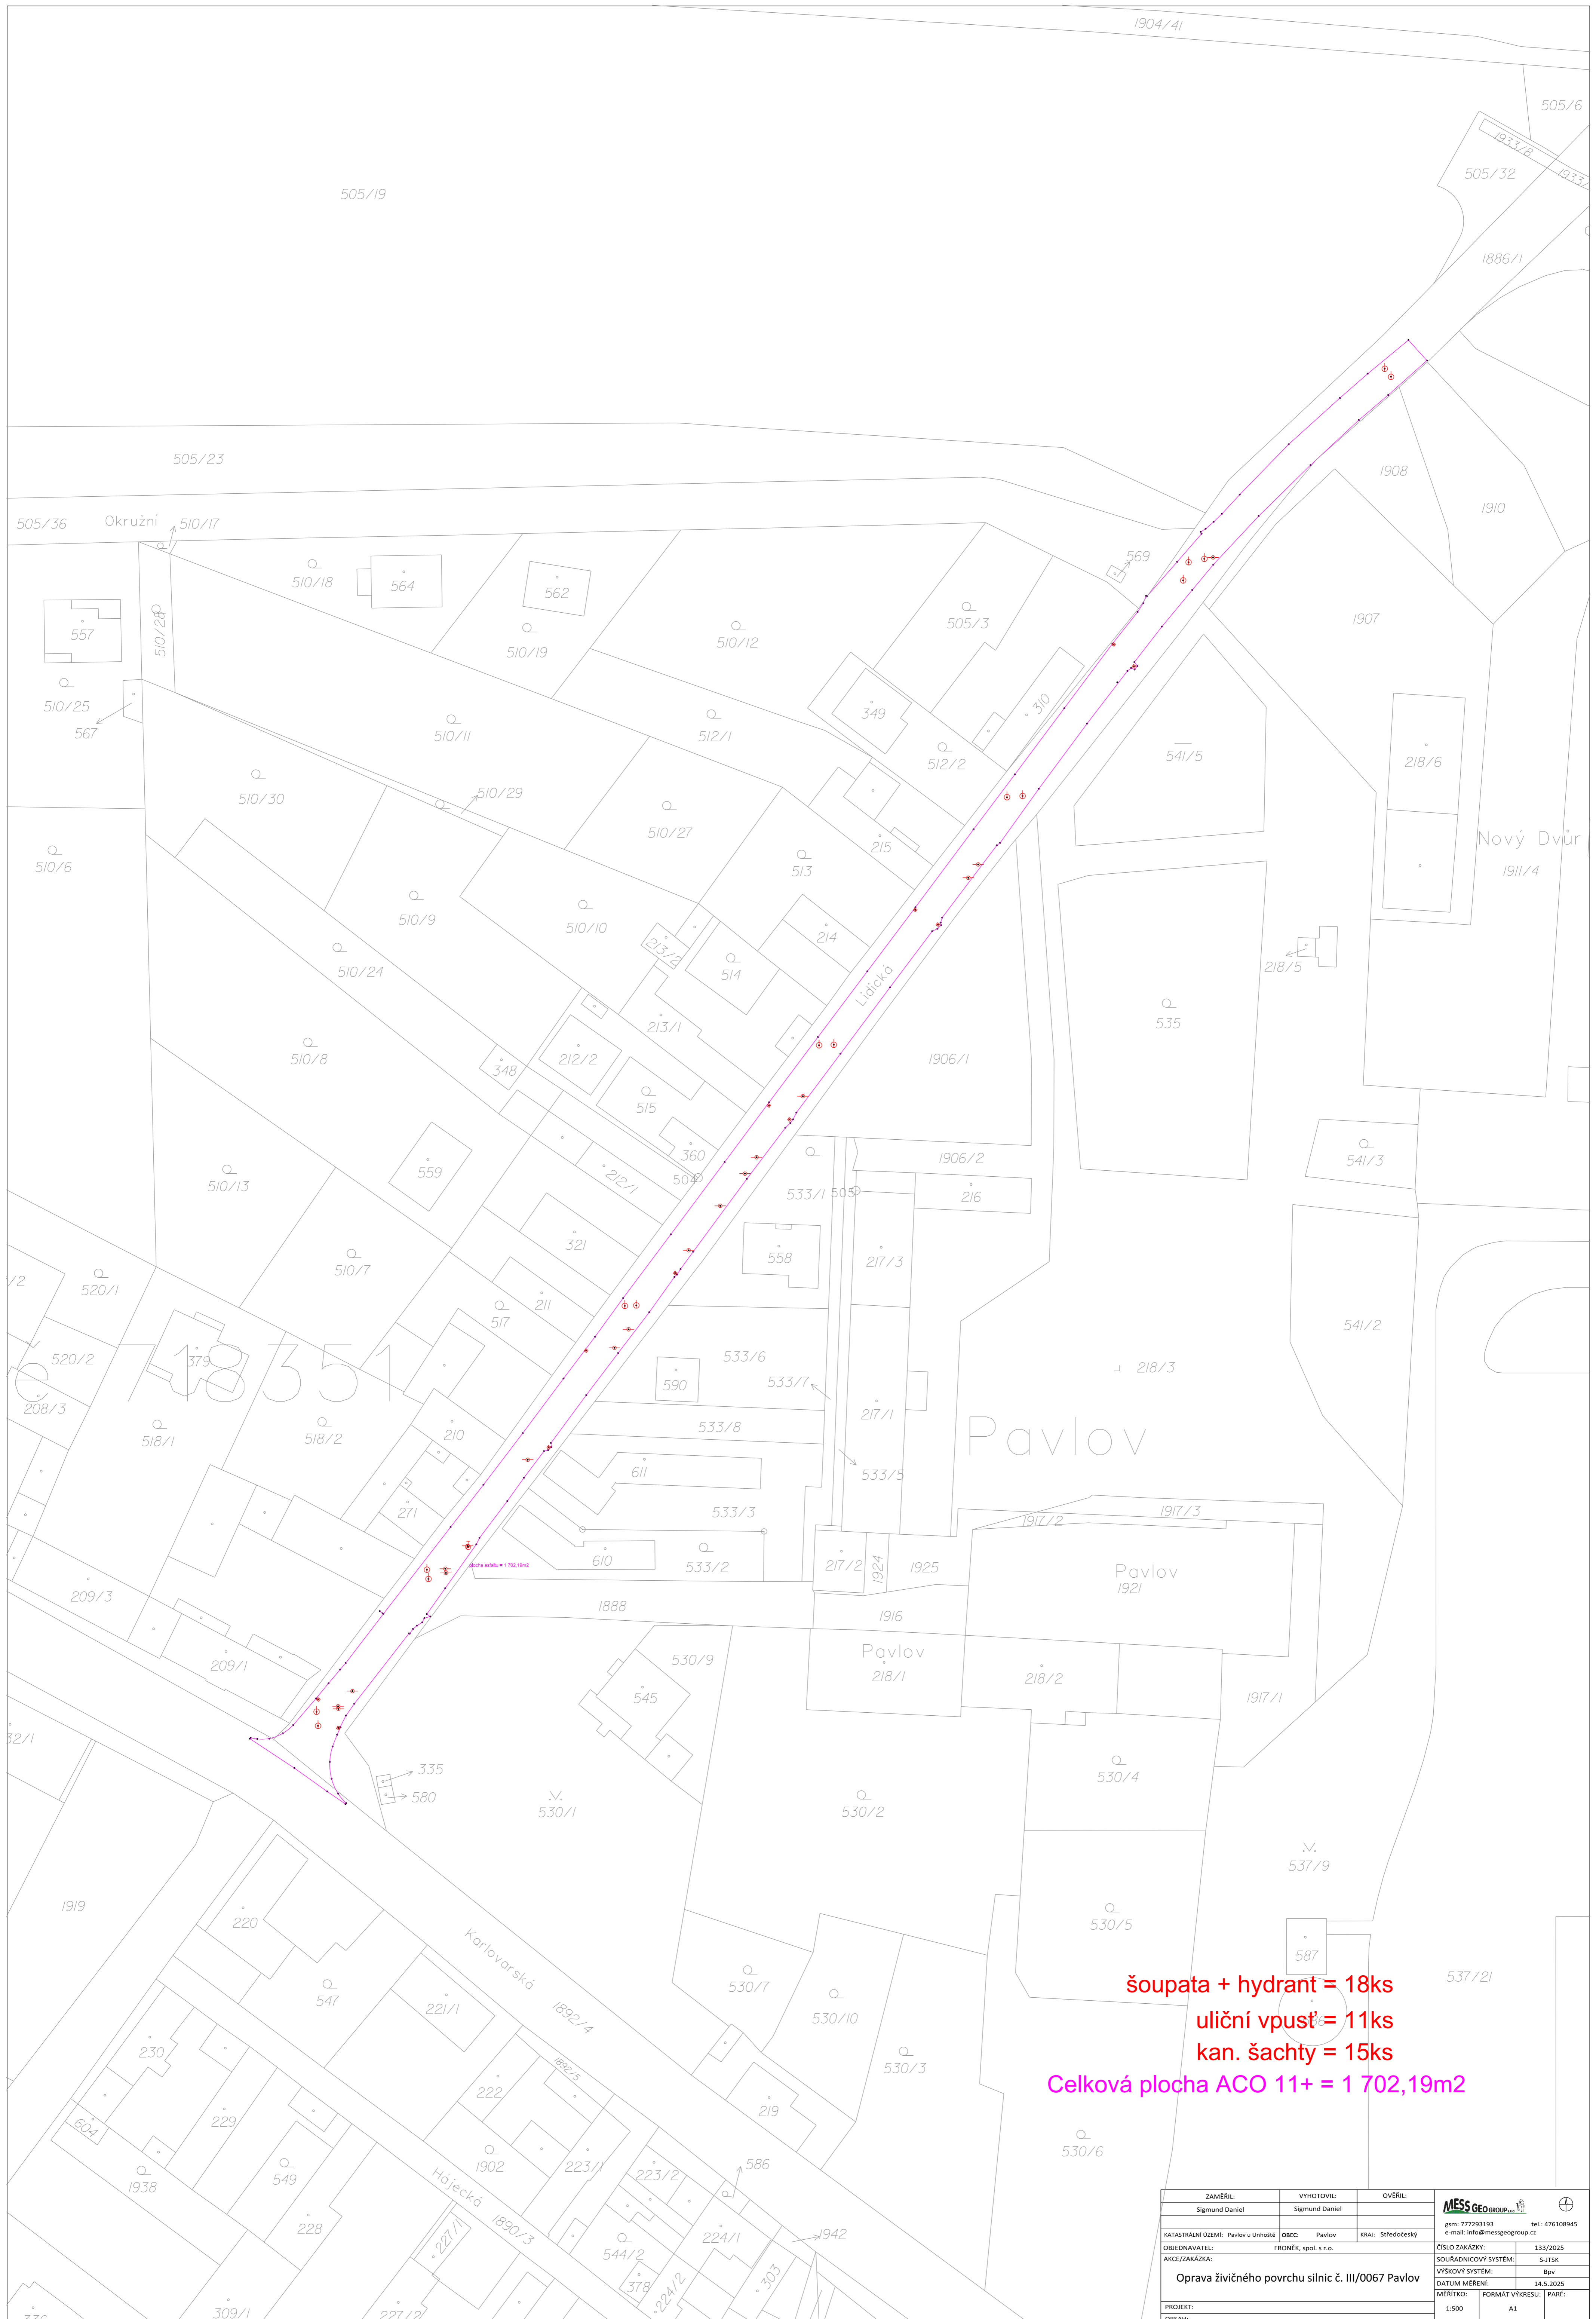

šoupata + hydrant = 18ks
 uliční vpust = 11ks
 kan. šachty = 15ks
 Celková plocha ACO 11+ = 1 702,19m²

ZAMĚŘIL:	VYFOTOVIL:	OVĚŘIL:	
Sigmund Daniel	Sigmund Daniel		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Pavlov u Unhoště	OBEC:	Pavlov
AKCE/ZAKÁZKA:	FRONEX, spol. s r.o.	KRAJ:	Středočeský
Oprava živичného povrchu silnic č. III/0067 Pavlov			ČÍSLO ZAKÁZKY: 133/2025 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv DATUM MĚŘENÍ: 14.5.2025 MĚŘÍTKO: 1:500 FORMÁT VÝKRESU: PARE:
PROJEKT:			
OBSAH:			

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek

Stavební objekt: sil. III/0067 v km 2,020-2,370 Pavlov

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
R položka	DIO vč.zajištění, zjištění a vytyčení inž.sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	1,00

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrtý, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
04/2025	komplet	1,00	1,00
05/2025	fakturováno 4/25	0,00	1,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek

Stavební objekt: sil. III/0067 v km 2,020-2,370 Pavlov

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
113728	Frézovaná asphalt.ploch, odvoz do 20 km	m3	96,50

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrty, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
04/2025	fakturace 80 %	77,00	77,00
05/2025	plocha opravy 1702,19m ² 1702 x 0,05 = 85,1 m³ příloha 1 zaměření geodetem	8,10	85,10

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek

Stavební objekt: sil. III/0067 v km 2,020-2,370 Pavlov

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
919111	Řezání asfaltového krytu vozovek do 50 mm	bm	20,00

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrtý, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
04/2025	fakturace 80 %	16,00	16,00
05/2025	měřeno kolečkem pracovní spáry 49 m ZBV 49m - 20m = 29m příloha 2 zápis stavební deník	4,00	20,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek

Stavební objekt: sil. III/0067 v km 2,020-2,370 Pavlov

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
93818	Čištění vozovek samosběrem	m2	1930,00

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrtý, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
04/2025	fakturace 80 %	1550,00	1550,00
05/2025	plocha opravy 1702,19m2 příloha 1 zaměření geodetem	152,00	1702,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek

Stavební objekt: sil. III/0067 v km 2,020-2,370 Pavlov

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
572223	Spojovací postřik ze sil.emulze do 1,0 kg/m ²	m ²	1930,00

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrtý, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
04/2025	fakturace 80 %		1550,00
05/2025	plocha opravy 1702,19m ²	152,00	1702,00
	příloha 1 zaměření geodetem		

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek

Stavební objekt: sil. III/0067 v km 2,020-2,370 Pavlov

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
574A44	Asfalt.beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm	m2	1930,00

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrtý, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
04/2025	fakturace 80 %		1550,00
05/2025	plocha opravy 1702,19m2 příloha 1 zaměření geodetem Příloha č. 3 - sjetina vážních lístků	152,00	1702,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek

Stavební objekt: sil. III/0067 v km 2,020-2,370 Pavlov

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
89921	Výšková úprava šachty, vpusti	ks	22,00

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrtý, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
04/2025	fakturace 80 %		17,00
05/2025	dle zaměření 15 šachet + 11 vpustí = 26 ks ZBV 26 ks - 20 ks = 6 ks příloha 1 zaměření geodetem	5,00	17,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek

Stavební objekt: sil. III/0067 v km 2,020-2,370 Pavlov

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
89923	Výšková úprava krycích hrnců	ks	12,00

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrty, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
04/2025	fakturace 80 %		10,00
05/2025	dle zaměření 18 ks ZBV 18 ks - 12 ks = 6 ks příloha 1 zaměření geodetem	2,00	12,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek

Stavební objekt: sil. III/0067 v km 2,020-2,370 Pavlov

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
113761	Frézování drážky průřezu spár š.do 100 mm ²	m	20,00

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrtý, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
04/2025	fakturace 80 %		16,00
05/2025	měřeno kolečkem pracovní spáry 49 m ZBV 49m - 20m = 29m příloha 2 zápis stavební deník	4,00	20,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek

Stavební objekt: sil. III/0067 v km 2,020-2,370 Pavlov

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
931311	Ztěsnění dilatačních spár asf.zálivkou průřezu do 100 mm ²	m	20,00

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrty, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
04/2025	fakturace 80 %		16,00
05/2025	měřeno kolečkem pracovní spáry 49 m ZBV 49m - 20m = 29m příloha 2 zápis stavební deník	4,00	20,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek

Stavební objekt: sil. III/0067 v km 2,020-2,370 Pavlov

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
12922	Čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	200,00

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrty, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
04/2025	fakturace 80 %	160,00	160,00
05/2025	dofakturováno 100%	40,00	200,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek

Stavební objekt: sil. III/0067 v km 2,020-2,370 Pavlov

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
56962	Zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100 mm	m2	200,00

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrtý, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
04/2025	fakturace 80 %	160,00	160,00
05/2025	dofakturováno 100%	40,00	200,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek

Stavební objekt: sil. III/0067 v km 2,020-2,370 Pavlov

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
015111	Poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	26,00

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrtý, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
04/2025	fakturace 80 %	21,00	21,00
05/2025	dofakturováno 100%	5,00	26,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek

Stavební objekt: sil. III/0067 v km 2,020-2,370 Pavlov

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
915111	VDZ V4 - 12,5 cm, barvou, základní	m2	88,00

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrtý, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
04/2025	fakturace 80 %	70,00	70,00
05/2025	Liniové $320,51 \text{ m} \times 2 \times 0,125 \text{ m} = 80,125 \text{ m}^2$ Plošné celkem 8 m ² příloha 1 zaměření geodetem	18,00	88,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek

Stavební objekt: sil. III/0067 v km 2,020-2,370 Pavlov

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství
915211	VDZ - vodící proužky, V4 - 12,5, přechod pro chodce atd., plast, retroflexní	m2	88,00

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrty, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno
04/2025		0,00	0,00
05/2025	Liniové 320,51 m x 2 x 0,125 m = 80,125 m2 Plošné celkem 8 m2 příloha 1 zaměření geodetem	88,00	88,00

podání: 5^h 15^h polovina
 Mochov: Rigel, MAM 080, vit. desky
 pilas, MBR 154316, copwasa
 Lvošs č. 962
 pracovní: Macek, Vítala, Šika
 Misa, Dikl, Madler
 Růžička, Tondra, J. Š. D
 Hovák, J. Š. D, J. Š. D
 pracovní doba: 7^h - 12^h

Práce: Pátek - Brundis
 - polovina krajce z R. mat.
 0-22
 - kotel krajce
 - ošetření epich mod. zřítelky
 a provizurní
 měření kolečkom
 Brundis 167 m
 Pátek 149



Brundis.

- kotel krajce korigován
- ošetření krajce na zřítelce
- zřítel. SA 0-63
- kotel vit. desky
- polovina AKP 16 50/20
 11.10 cm v sádkách
- kotel MAM 080 a vit. kole 5x.
- úklid střeš
- kotel DIO a



III/80067 Pavlov

Zakázka - název	Vážený lístek č.	Datum	SPZ	Název zboží	Netto
125015 - KSÚS - III/80067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek	171292	23.04.2025	8AA 9858	ACO 11+ 50/70	30,54
125015 - KSÚS - III/80067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek	171288	23.04.2025	3SL 8510	ACO 11+ 50/70	30,86
125015 - KSÚS - III/80067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek	171287	23.04.2025	9AM 8665	ACO 11+ 50/70	30,36
125015 - KSÚS - III/80067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek	171285	23.04.2025	6SC 1014	ACO 11+ 50/70	30,1
125015 - KSÚS - III/80067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek	171284	23.04.2025	3S9 8386	ACO 11+ 50/70	14,88
125015 - KSÚS - III/80067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek	171283	23.04.2025	3SM 0439	ACO 11+ 50/70	29,96
125015 - KSÚS - III/80067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek	171280	23.04.2025	7S2 5077	ACO 11+ 50/70	30,64
125015 - KSÚS - III/80067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek	171279	23.04.2025	3SL 8520	ACO 11+ 50/70	30,7

228,04



Freněk, s.p.
Zátisí 2486, CZ 269 01 Rakovník
www.frenek.cz, DIČ: CZ47534030

Priloha č. 3

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek“

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Číslo Jednací: ohlášení_změn_stavby 02-04

Číslo SoD: SMLD-0427/00066001/2025

Termín plnění: 6 týdnů od předání staveniště

Celková cena díla: 8 574 748,60,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

IČ: 47534630

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace:

III/0067 Pavlov, III/00719 Buštěhrad, III/0067 Hostouň

Popis problému:

Po zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno odlišné množství od původního rozpočtu dle SoD. Jednotlivé položky jsou vyčísleny v soupisech prací potvrzených TDS (viz příloha č. 1).

Čeho se zhotovitel domáhá:

Výše uvedeným dochází ke změně výkazu výměr, čímž dojde ke změně oproti SoD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV. Tato skutečnost má finanční dopad na výstavbu, a to z důvodu úpravy položek výkazu výměr.

Datum, podpis oprávněné osoby

16.6.2025

Tomáš Macálka



www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

Přílohy:

Příloha č. 1 – soupisy provedených prací

Soupis provedených prací 05/2025

Stavba: III/0067 Pavlov
Objekt: sil. III/0067 v km 2,020-2,370

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel:
rozpočet


Zpracoval: Tomáš Macálka
Datum: 23.5.2025

1

05/2025

ZBÝVÁ

Číslo položky	Popis položky	MJ	Výměra	Kč/MJ (OTSKP 2024)	Celkem Kč	Výměra	Celkem Kč	Výměra	Celkem Kč	
R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	96,50	504,00	48 636,00	8,10	4 082,40	11,40	5 745,60	
919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	20,00	44,00	880,00	4,00	176,00	0,00	0,00	ZBV 29 m
93818	čištění vozovek samosběrem	m2	1930,00	3,00	5 790,00	152,00	456,00	228,00	684,00	
572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	1930,00	7,00	13 510,00	152,00	1 064,00	228,00	1 596,00	
574A44	asfalt. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm,	m2	1930,00	186,00	358 980,00	152,00	28 272,00	228,00	42 408,00	
89921	výšková úprava šachty, vpusti	ks	22,00	4 000,00	88 000,00	5,00	20 000,00	0,00	0,00	ZBV 6 ks
89923	výšková úprava krycích hmců	ks	12,00	1 920,00	23 040,00	2,00	3 840,00	0,00	0,00	ZBV 6 ks
113761	frézování drážky průřezu spár š. do 100mm2	m	20,00	44,00	880,00	4,00	176,00	0,00	0,00	ZBV 29 m
931311	Ztěsnění dilatačních spar asf. zálivkou průřezu do 100mm2	m	20,00	48,00	960,00	4,00	192,00	0,00	0,00	ZBV 29 m
12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	200,00	35,00	7 000,00	40,00	1 400,00	0,00	0,00	
56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	200,00	214,00	42 800,00	40,00	8 560,00	0,00	0,00	
015111	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	26,00	160,00	4 160,00	5,00	800,00	0,00	0,00	
915111	VDZ V4 - 12,5 cm, barvou, základní	m2	88,00	120,00	10 560,00	18,00	2 160,00	0,00	0,00	
915211	VDZ - vodící proužky V4 -12,5, přechod pro chodce atd., plast, retroreflexn	m2	88,00	270,00	23 760,00	88,00	23 760,00	0,00	0,00	
	Celkem bez DPH				663 456,00		94 938,40		50 433,60	
	DPH 21%				139 325,76		19 937,06		10 591,06	
	Celkem vč. DPH				802 781,76		114 875,46		61 024,66	



Soupis provedených prací 05/2025

Stavba:

Objekt: sil. III/00719 Buštěhrad v km 1.470 - 2,630

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel:
rozpočet

Zpracoval: Tomáš Macálka
Datum: 30.4.2025

1

05/2025

ZBÝVÁ

Číslo položky	Popis položky	MJ	Výměra	Kč/MJ (OTS KP 2024)	Celkem Kč	Výměra	Celkem Kč	Výměra	Celkem Kč	
R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	64 100,00	64 100,00	0,50	32 050,00	0,00	0,00	
113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	336,40	555,00	186 702,00	62,20	34 521,00	4,20	2 331,00	
919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	52,00	44,00	2 288,00	52,00	2 288,00	0,00	0,00	ZBV 115 m
93818	čištění vozovek samosběrem	m2	6728,00	3,00	20 184,00	6644,00	19 932,00	84,00	252,00	
574A04	asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo11+ (tl. 40 mm)	m3	269,10	3 766,00	1 013 430,60	265,76	1 000 852,16	3,34	12 578,44	
572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	13456,00	7,00	94 192,00	13456,00	94 192,00	0,00	0,00	
574C46	asfalt. beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm,	m2	6728,00	167,00	1 123 576,00	6399,00	1 068 633,00	329,00	54 943,00	
R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 400 mm (dle technické specifikace)	m2	1500,00	701,00	1 051 500,00	731,00	512 431,00	269,00	188 569,00	
89921	výšková úprava šachty, vpusti	ks	4,00	4 500,00	18 000,00	4,00	18 000,00	0,00	0,00	ZBV 1 ks
89923	výšková úprava krycích hrců	ks	5,00	1 920,00	9 600,00	5,00	9 600,00	0,00	0,00	ZBV 1 ks
113761	frézování drážky průřezu spár š. do 100mm2	m	52,00	44,00	2 288,00	52,00	2 288,00	0,00	0,00	ZBV 115 m
931311	Ztěsnění dilatačních spar asf. zálivkou průřezu do 100mm2	m	52,00	48,00	2 496,00	52,00	2 496,00	0,00	0,00	ZBV 115 m
12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	2100,00	35,00	73 500,00	2100,00	73 500,00	0,00	0,00	
56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	2100,00	79,00	165 900,00	2100,00	165 900,00	0,00	0,00	
12931	čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem na skládku	m	1926,00	45,00	86 670,00	1926,00	86 670,00	0,00	0,00	
015111	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	1100,00	160,00	176 000,00	1100,00	176 000,00	0,00	0,00	
915111	VDZ V4 - 12,5 cm , barvou, základní	m2	290,00	120,00	34 800,00	290,00	34 800,00	0,00	0,00	
915211	VDZ - vodící proužky V4 -12,5 , přechod pro chodce atd. , plast, retroreflexn	m2	290,00	270,00	78 300,00	290,00	78 300,00	0,00	0,00	
	Celkem bez DPH				4 203 526,60		3 412 453,16		258 673,44	
	DPH 21%				882 740,59		716 615,16		54 321,42	
	Celkem vč. DPH				5 086 267,19		4 129 068,32		312 994,86	

Soupis provedených prací 05/2025

Stavba:

Objekt: sil. III/0067 Hostouň v km 5,560 - 6,020

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel:

rozpočet

Zpracoval: Tomáš Macálka

Datum:

1

05/2025


ZBÝVÁ

Číslo položky	Popis položky	MJ	Výměra	Kč/MJ (OTS KP 2024)	Celkem Kč	Výměra	Celkem Kč	Výměra	Celkem Kč
R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	18 540,00	18 540,00	1,00	18 540,00	0,00	0,00
113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km, do tl. 40mm	m3	122,00	527,00	64 294,00	101,00	53 227,00	21,00	11 067,00
919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	50,00	44,00	2 200,00	50,00	2 200,00	0,00	0,00
93818	čištění vozovek samosběrem	m2	3036,00	3,00	9 108,00	2524,00	7 572,00	512,00	1 536,00
574A04	asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo11+ - lokální vyrovnávka, objem stanoven odborným odhadem	m3	55,00	3 743,00	205 865,00	52,40	196 133,20	2,60	9 731,80
572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	3036,00	7,00	21 252,00	2524,00	17 668,00	512,00	3 584,00
574A44	asfalt. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm,	m2	3036,00	187,00	567 732,00	2524,00	471 988,00	512,00	95 744,00
113761	frézování drážky průřezu spár š. do 100mm2	m	50,00	44,00	2 200,00	50,00	2 200,00	0,00	0,00
931311	Ztěsnění dilatačních spar asf. zálivkou průřezu do 100mm2	m	50,00	48,00	2 400,00	50,00	2 400,00	0,00	0,00
12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	450,00	35,00	15 750,00	450,00	15 750,00	0,00	0,00
56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	450,00	116,00	52 200,00	450,00	52 200,00	0,00	0,00
015111	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	60,00	160,00	9 600,00	60,00	9 600,00	0,00	0,00
915111	VDZ V4 - 12,5 cm , barvou, základní	m2	115,00	120,00	13 800,00	115,00	13 800,00	0,00	0,00
915211	VDZ - vodící proužky V4 -12,5 , přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní	m2	115,00	270,00	31 050,00	115,00	31 050,00	0,00	0,00
	Celkem bez DPH				1 015 991,00		894 328,20		121 662,80
	DPH 21%				213 358,11		187 808,92		25 549,19
	Celkem vč. DPH				1 229 349,11		1 082 137,12		147 211,99

ZBV 8 m

ZBV 8 m

ZBV 8 m





V Kladně dne: 18.června 2025

Vyřizuje: P. Burger

KSSÚ Středočeského kraje
Zborovská 11
150 00 Praha 5

Věc: „111/0067 Pavlov a Hostouň, 111/00719 Buštěhrad, 111/10141
Brandýsek“

Vyjádření TDS – ZBV 2-4

Úsek 111/0067 Pavlov a Hostouň, 111/00719 Buštěhrad

Po zaměření skutečného zaměření stavby bylo zjištěno odlišné množství od původního zadání jednotlivých položek dle SoD.

Změny byly vyčíslena dle skutečného zaměření.


S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které dodavatel nemohl předvídat a ani je nezavinil, technický dozor objednatele souhlasí se zpracování ZBV a považuje je za oprávněné.

Změny v rozsahu stavebních prací jsou písemně zdokumentovány a budou doloženy zaměřením.

Z návrhu změn vyplývá, že jsou nezbytné pro realizaci stavby.

za IBH s.r.o.

Petr Burger



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488
269 01 Rakovník
IČO: 47534630**

Vás dopis značky/ze dne
16.06.2025

Vyřizuje/telefon

Praha
03.07.2025

**Věc: Stavba „III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek“
– oznámení o zjištěné skutečnosti k ZBV 2, 3, 4**

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 16. 06. 2025, se jedná o následující změny oproti zadávací dokumentaci, které nešly předvídat a které vznikly během realizace stavby „III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek“:

Po zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno odlišné množství od původního zadání jednotlivých položek dle SoD. Změny byly vyčísleny dle skutečného zaměření.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje, jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčených silnic III/0067, III/00719, III/10141 a jako zadavatel výše zmíněné stavby, tímto souhlasí s provedením opravy dle uvedených změn a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 2, 3, 4 k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Krajská s
Středoče
příspěvkov
Zborovská 1
IČO: 000980

Pavel Spaček
projektový manažer staveb

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 16. 06. 2025
